



スタンド型タイプ (地下水あり)

標準歩掛り表

■トルク連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目		単位	公 称 内 高 (mm)																
			1500		2000		2500		3000		3500		4000		4500		5000		
			コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	
世 話 役		人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	
特殊作業員		人	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.57	0.50	
普通作業員		人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.38	0.43	0.38	
ラフテレーン クレーン		賃 料	日	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	
		規格	t	25		25		25		35		25		25		35		45	
諸 雑 費			5%																
種 目		単位	公 称 内 高 (mm)								備 考								
			5500		6000		6500		7000										
			コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック									
世 話 役		人	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17									
特殊作業員		人	0.57	0.50	0.67	0.57	0.80	0.67	0.80	0.67									
普通作業員		人	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.50	0.60	0.50									
ラフテレーン クレーン		賃 料	日	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17								
		規格	t	50		100		100		100									
諸 雑 費			5%																

■PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目		単位	公 称 内 高 (mm)															
			1500		2000		2500		3000		3500		4000		4500		5000	
			コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世 話 役		人	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14
特殊作業員		人	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.57	0.57	0.67	0.57
普通作業員		人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.33	0.33	0.43	0.43	0.43	0.43	0.50	0.43
ラフテレーン クレーン	賃 料	日	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14
	規 格	t	25		25		25		35		25		25		35		45	
諸 雑 費			5%															
種 目		単位	公 称 内 高 (mm)								備 考							
			5500		6000		6500		7000									
			コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック								
世 話 役		人	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20								
特殊作業員		人	0.67	0.57	0.80	0.67	1.00	0.80	1.00	0.80								
普通作業員		人	0.50	0.43	0.60	0.50	0.75	0.60	0.75	0.60								
ラフテレーン クレーン	賃 料	日	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20								
	規 格	t	50		100		100		100									
諸 雑 費			5%															

■目地工歩掛り (地下水あり)


(1箇所当り)

種 目	単位	公 称 内 高 (mm)															
		1500		2000		2500		3000		3500		4000		4500		5000	
		コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック
世 話 役	人	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10	0.13	0.09	0.14	0.09	0.15	0.10	0.17	0.10
防 水 工	人	0.16	0.20	0.18	0.20	0.22	0.21	0.24	0.21	0.26	0.18	0.30	0.18	0.32	0.21	0.36	0.21
ポリウレタン樹脂	kg	1.96	3.10	2.21	3.10	2.47	3.15	2.73	3.15	2.76	2.70	3.00	2.70	3.38	3.06	3.65	3.06
諸 雑 費		5%								25%							
種 目	単位	公 称 内 高 (mm)								備 考							
		5500		6000		6500		7000									
		コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック	コーナ ーブロ ック	センタ ーブロ ック								
世 話 役	人	0.18	0.11	0.20	0.11	0.22	0.11	0.24	0.11								
防 水 工	人	0.39	0.21	0.42	0.21	0.47	0.23	0.50	0.23								
ポリウレタン樹脂	kg	3.89	3.06	4.15	3.06	4.49	3.29	4.74	3.29								
諸 雑 費		25%								1.歩掛りはポリウレタン樹脂材を使用したマスキングテープ養生、バックアップ材取付け、プライマー塗布、シーリング材充填等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン樹脂はプライマーおよび作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。							

頂版スラブ据付工歩掛り

(1枚当り)

種 目	単位	サイズ	
		3m用	4m用
世 話 役	人	0.04	0.04
特殊作業員	人	0.04	0.04
普通作業員	人	0.08	0.08
ラフテレーン クレーン	賃 料	日	0.04
	吊上げ荷重	t	本体ブロック据付けクレーン使用
諸 雑 費		4%	
備 考		1.歩掛りは据付け歩掛りとボルトによる連結工の一連の作業とします。 2.ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。なお、クレーンの規格は基礎面施工による据付け工を適用し、地表面施工の場合は作業半径にあった規格を選定して計上します。ただし、規格が100tの場合は運転日数や組立て・解体を考慮し、クローラークレーンとすることも可能です。 3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料およびモルタル充填費であり、労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。	

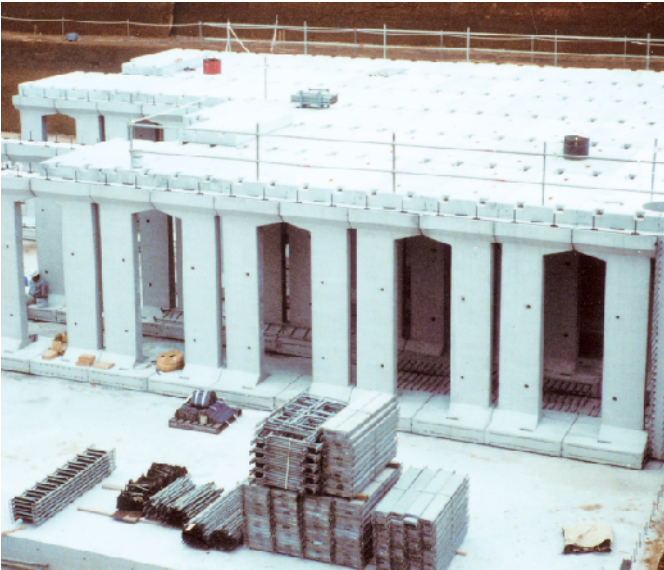

■頂版スラブ目地工歩掛り

(1箇所当り)

3m用													
種 目	単位	地下水あり											
		公 称 内 高 (mm)											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
世 話 役	人	0.15	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
防 水 工	人	0.31	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
ポリウレタン樹脂	kg	1.96	1.96	1.96	1.96	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
諸 雑 費		5%		25%									

4m用													
種 目	単位	地下水あり											
		公 称 内 高 (mm)											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
世 話 役	人	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
防 水 工	人	0.36	0.40	0.40	0.40	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ポリウレタン樹脂	kg	2.47	2.47	2.47	2.47	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
諸 雑 費		5%			25%								
備 考		1.歩掛りはポリウレタン樹脂材を使用したマスキングテープ養生、バックアップ材取付け、プライマー塗布、シーリング材充填、ライニング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン樹脂はプライマー、トップコートおよび作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。											
